RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 1 堂

蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

從各做各的，到 Global Control Center：我們要一起打通的數位底座

RSI Reliable Source Industrial

模組一　現況盤點與組織共識　｜　2026/11/02（一）　｜　120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

看懂全貌

說得出 RSI 營運主流程、 2027–2029 系統發展路線，以及蜂巢計畫第一階段要打通的底座。

2

對齊治理原則

理解 Global Control Center 模式：總部統一決策，各產區回饋校正；報表可不同，管理邏輯必須一致。

3

知道自己的位置

清楚自己所屬團隊在蜂巢計畫九項任務中的角色，以及接下來十二堂要完成的交付。

120 分鐘議程

0–15 分	開場、周副總致詞與講師介紹	課程定位、日程與上課方式
15–45 分	Part 1　RSI 營運全貌	成衣流程、系統地圖、 2027–2029 路線
45–70 分	Part 2　蜂巢計畫第一階段	六階段、九項任務、六個決策閘門
70–80 分	中場休息	
80–110 分	Part 3　演練：我的系統、我的角色	各團隊對照任務與窗口
110–120 分	總結與作業	準備現況盤點

課程全貌：十二堂的學習地圖

模組	堂次	主題	對應蜂巢里程碑
一　現況盤點與組織共識	1–3	計畫總覽、系統與職能盤點、 IT 分工與權責	D02 窗口指派、現況清冊
二　業務流程與資料底座	4–6	成衣流程與 KPI 、 API Platform 、 Data Lake	D01 範圍、 D03 首批標的
三　平台選型與工程治理	7–9	選型與雲地配置、 SCM 與技術棧、 AI Coding	D04 選型、 CQS 燈塔
四　AI 應用、資安與推廣	10–12	GenAI 應用治理、資安韌性、試點推廣與交接	D05 承接、維運交接

課程日程： 12 週、 17 服務日

週次	日期	堂次與主題
W1	2026/11/02 （一）	第 1 堂　蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽
W2	2026/11/09 （一）	第 2 堂　現況盤點與技術職能盤點
W3	2026/11/16 （一）	第 3 堂　IT 組織分工與權責
W4	2026/11/23 （一）	第 4 堂　成衣業務流程、資料與 KPI
W5	2026/11/30 （一）	第 5 堂　API Platform 與 API 管理
W6	2026/12/07 （一）	第 6 堂　Data Lake 與資料治理
W7	2026/12/14 （一）	第 7 堂　平台選型、 TCO 與雲地配置
W8	2026/12/21 （一）	第 8 堂　版控收斂與技術棧體檢
W9	2027/01/04 （一）	第 9 堂　AI Coding 生命週期管理
W10	2027/01/11 （一）	第 10 堂　生成式 AI 應用與治理
W11	2027/01/18 （一）	第 11 堂　資安與維運韌性
W12	2027/01/25 （一）	第 12 堂　試點推廣、維運交接與成果發表

課前暖身：三個問題

Q1 你負責的系統，支撐成衣流程的哪一個階段?

Q2 最近一次跨團隊要資料，花了多久才拿到?

Q3 如果明天要交一份全集團訂單成本報表，你最擔心哪一段?

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、 TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



▲ 本堂

每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出

畫出我負責的系統

一張團隊系統地圖：系統、支撐的流程階段、上下游介面

對照九項任務與窗口

團隊在九項任務中的角色（R／A／C／I）與建議窗口

課後作業

完成團隊系統地圖，並標出單點風險系統

課後作業

各團隊提出一位蜂巢計畫專責窗口與每週投入時數

課前準備檢查

準備項目	完成狀態	備註
確認自己所屬團隊與負責系統	☐ 完成	
帶筆電並可登入 GitLab 與 Notion	☐ 完成	
預讀蜂巢計畫實施藍圖摘要	☐ 完成	

本堂學習路徑

看懂全貌

說得出 RSI 營運主流程、 2027–2029 系統發展路線，以及蜂巢計畫第一階段要打通的底座。


對齊治理原則

理解 Global Control Center 模式：總部統一決策，各產區回饋校正；報表可不同，管理邏輯必須一致。

知道自己的位置

清楚自己所屬團隊在蜂巢計畫九項任務中的角色，以及接下來十二堂要完成的交付。

120 分鐘怎麼用

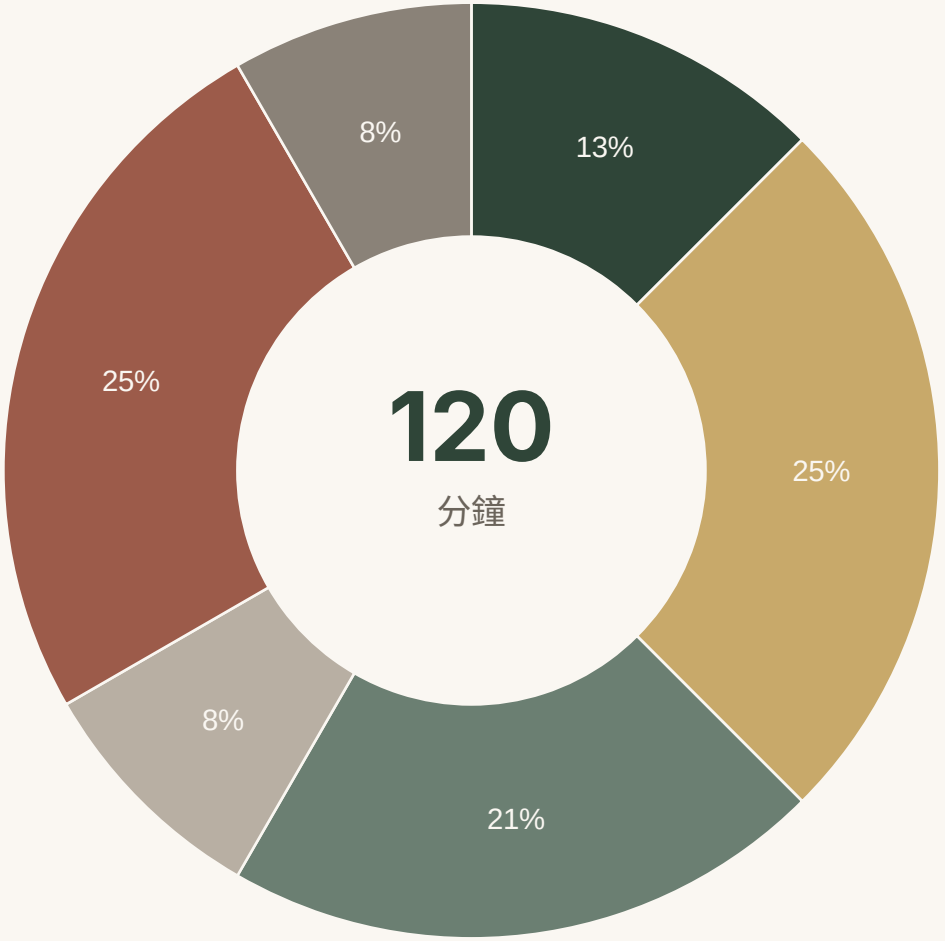

開場、周副總致詞與講師介紹	15 分
RSI 營運全貌	30 分
蜂巢計畫第一階段	25 分
中場休息	10 分
演練：我的系統、我的角色	30 分
總結與作業	10 分

PART 01

RSI 營運全貌

先看懂業務，才知道系統與資料該怎麼接。



本段導覽： RSI 營運全貌

01



成衣從開發到出貨

02



報價是怎麼組成的

03



RSI 系統發展路線（2027–2029）

04



Global Control Center： 治理模型已確定

05



系統需求的三個來源

成衣從開發到出貨

1

開發與企劃

流行資訊、季節企劃、可行性評估

2

打樣與報價

打樣試穿、 IE 估工、報價接單

3

產前與採購

排廠、買料跟單、PPS 產前樣

4

生產與品檢

物料品檢、大貨生產、 CFA 終檢

5

出口與結案

出口、客戶 DC 驗貨、帳務結案

PPS 須與客戶核可樣相符才能量產；大貨版、工藝流程與 SOP 交給工廠後不得更改

報價是怎麼組成的

1 原物料成本

主副料價格與用量。

2 IE 工序與工時

由 IE 估算工序與工時。

3 運費與管銷

原物料運至工廠的運費、管理費用與折舊。

加總為訂單成本，再加上目標利潤率；報價時同時決定生產工廠

RSI 系統發展路線（2027–2029）

年度	重點發展系統
2027	BPM／電子簽核、 RPA 、 BI／ IoT ／ AI Agent 、資產管理、 Tech Pack 自動翻譯 AI 、產區成本估算、成本試算、預算、前置管理
2028	成本（ ERP ）、固定資產（ ERP ）、產區／工廠訂單初排、工廠訂單安排確認
2029	年度營運規劃（ PJT 目標系統）、廠區產能規劃（佈局系統）
RPA 輔助	成衣出口安排、出口文件

Global Control Center： 治理模型已確定

呈現的報表可以不一樣，背後的管理邏輯必須一致。

周副總， 10/16 會議（轉述）。總部統一決策與控管，各產區的營運與維護需求回饋總部校正

系統需求的三個來源

1 總部直接推動

例如 ERP 、 MES 上線，以及推動中的 BPM 、 RPA 。

2 產區需求

由各廠 IT 主管收集後回報總部，通常規模較小。

3 副總年度評估

每年檢視最需補強之處，訂為下一年度推動重點。

總部政策評估後定案的項目，各地必須執行

試點與推廣的慣例


試點選擇

- 自動化與新技術：柬埔寨廠
- 管理面議題：越南廠
- 有工廠實務協助修正
- 試點驗證過，推廣就不會有大問題

推廣與維護

- 試點完成後推往其他據點
- 各廠 IT 主管承接推動
- 回總部受訓或線上訓練
- 誰開發，誰負責

RSI 數位轉型的四個支點

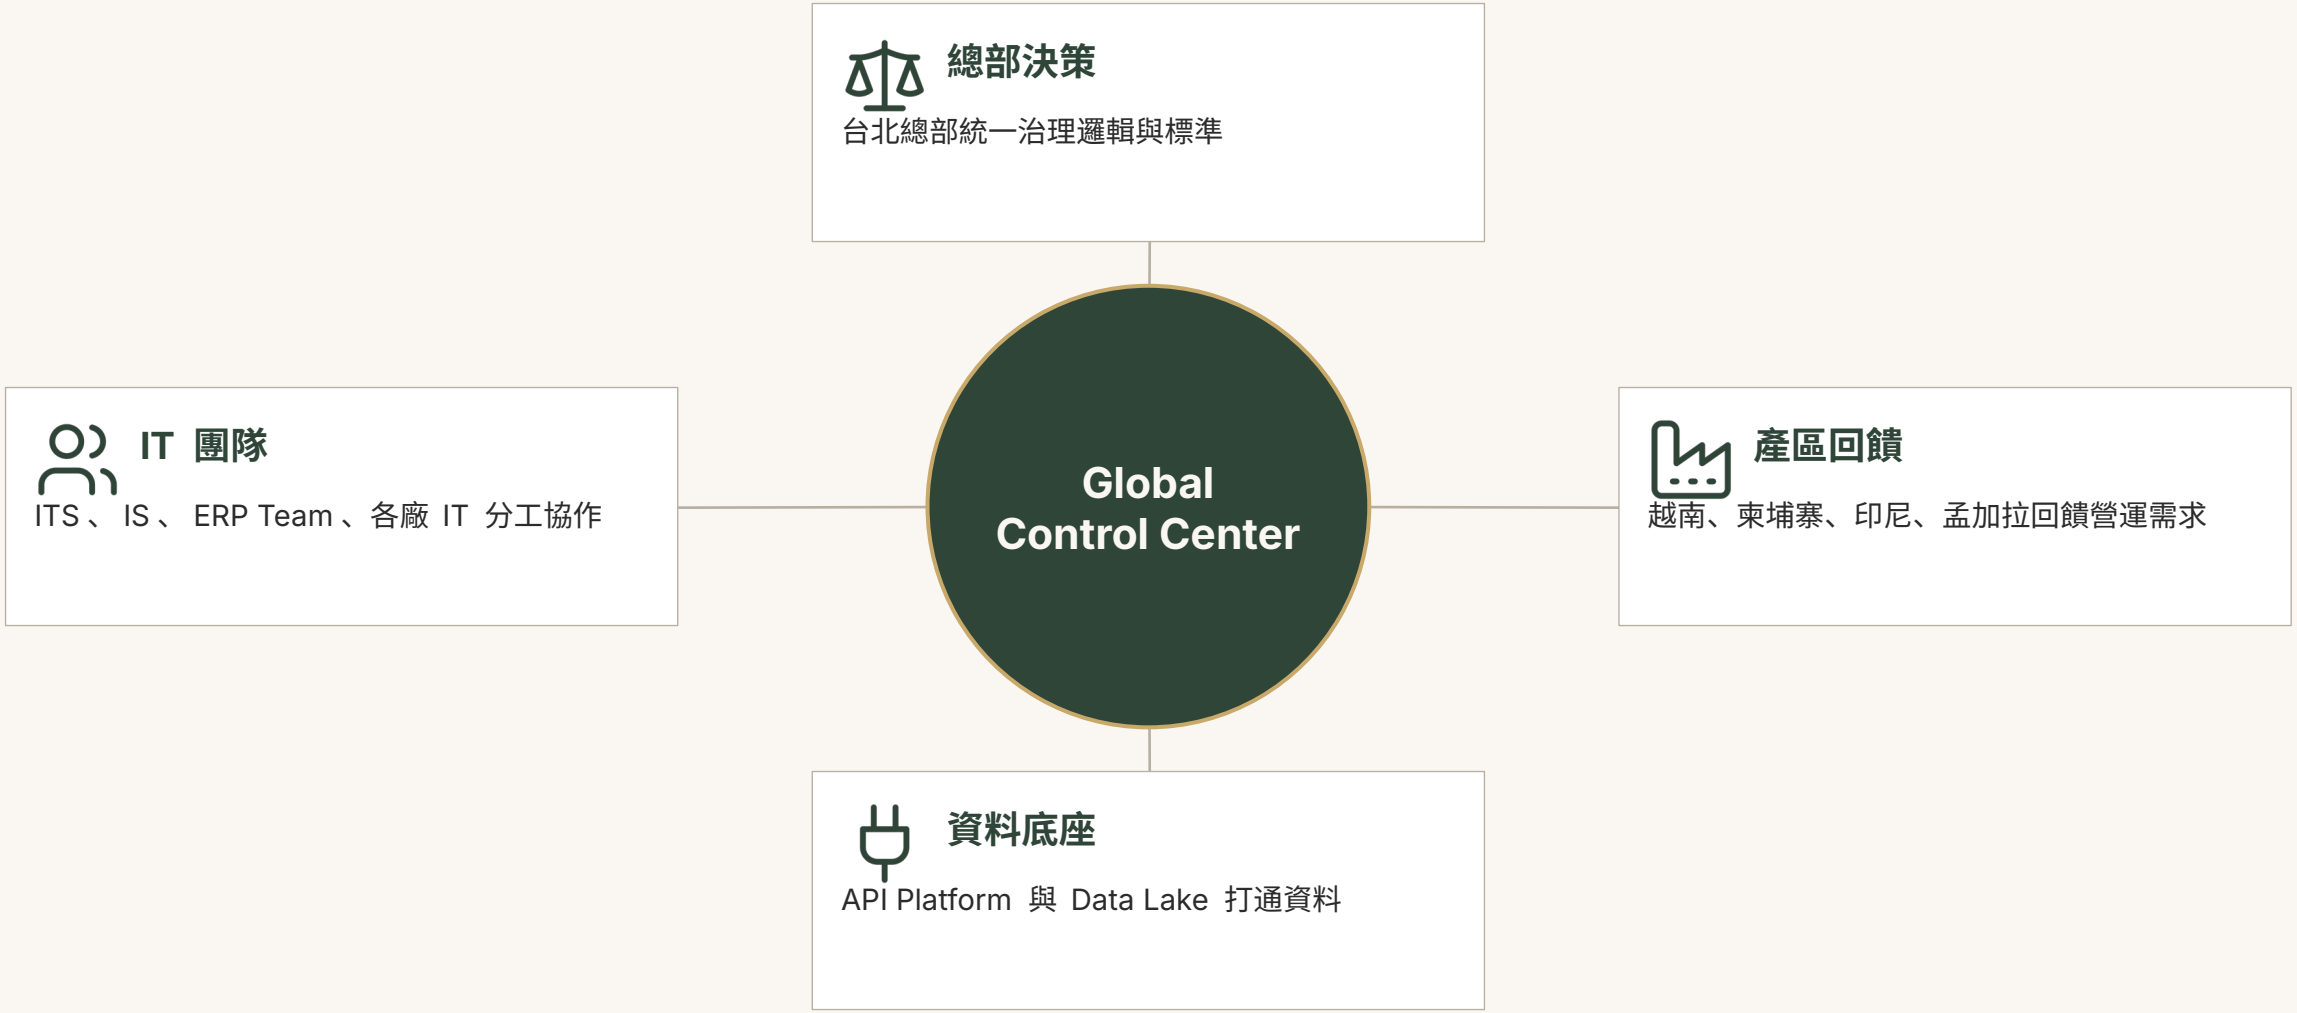

蜂巢計畫一頁看懂

6

個推進階段

現況盤點到維運交接

9

項第一階段任務

底座優先，集中資源

6

個決策閘門

D01～D06 由計劃主持人裁示

30

天連續無差異

第二階段的進入條件

數字皆依蜂巢計畫實施藍圖 v2.2

段落小結： RSI 營運全貌



管理邏輯一致

報表可以不同，背後的管理邏輯必須一致。

本段走過的主題

- 成衣從開發到出貨
- 報價是怎麼組成的
- RSI 系統發展路線（2027–2029）
- Global Control Center： 治理模型已確定
- 系統需求的三個來源
- 試點與推廣的慣例

PART 02

蜂巢計畫第一階段



打通台北總部與越南、柬埔寨、印尼、孟加拉各產區的 API Platform 與 Data Lake。

本段導覽：蜂巢計畫第一階段

01

蜂巢計畫要解決什麼

02

六階段推進

03

第一階段九項任務

04

六個待裁示的決策閘門

05

第二階段應用（進入條件後才建置）

蜂巢計畫要解決什麼

- 各廠系統與資料格式不一，跨廠整合很花人力
- API 與程式散落各處，彼此高度耦合
- 資料品質未經確認，無法掌握訂單實際成本
- KPI 定義未先確立，事後花大量時間挑選與過濾資料

第一階段目標

建立 API Platform 與 Data Lake，作為後續 BI、KPI 與 AI 應用的共同資料底座。

六階段推進

1

現況盤點

W1–W4

2

範圍確認

W5–W6

3

平台選型

W7–W10

4

PoC 驗證

W11–W18

5

建置與驗收

W19 起

6

維運交接

建置後 4 週

週數自專案啟動日（預計 2026 年 11 月初）起算，現況盤點後校正

第一階段九項任務

#	任務	主要交付
1	現況與需求盤點	現況清單、需求清單、窗口名單
2	API Platform 規劃與建置	API 清單、平台方案、首批串接範圍
3	Data Lake 規劃與建置	資料來源清單、資料平台方案
4	平台選型與成本評估	選型比較表、成本估算、建議方案
5	總部與工廠資料串接	串接規格、資料管線、測試結果
6	每日結算傳輸與特例通道	離峰排程、結算規則、流量管制
7	雲端部署與網路資安	部署架構、網路與資安需求
8	PoC 與階段驗收	PoC 報告、驗收結果
9	執行與維運分工	分工表、維運責任與交接清單

六個待裁示的決策閘門

閘門	決策	最晚時點
D01	第一階段範圍：建議僅底座，集中資源先打通資料	階段 2 結束（W6）
D02	窗口指派： ITS 、 IS 、 ERP Team 、各產區 IT 與業務各一位	階段 1 第 2 週（W2）
D03	首批標的：系統與試點廠	階段 2 結束（W6）
D04	預算時程：先核 PoC 預算，正式建置於 PoC 後核定	階段 3 結束（W10）
D05	開發與維運承接團隊， PoC 前確定	階段 4 開始前（W10）
D06	資料落地區域：先完成各國法規檢核	階段 3 結束（W10）

第二階段應用（進入條件後才建置）

1 BI 與 KPI

既有聯銓 BI 優化、 KPI 指標系統化。

2 品質驗證


資料串回後確認品質，以 6 Sigma 分析差異。

3 AI 應用

Agentic AI ／ RAG 情境、 AI 主機與硬體評估。

進入條件： PoC 驗收通過，且首批工廠資料連續 30 天每日結算無差異

第一階段九項任務的三個群組

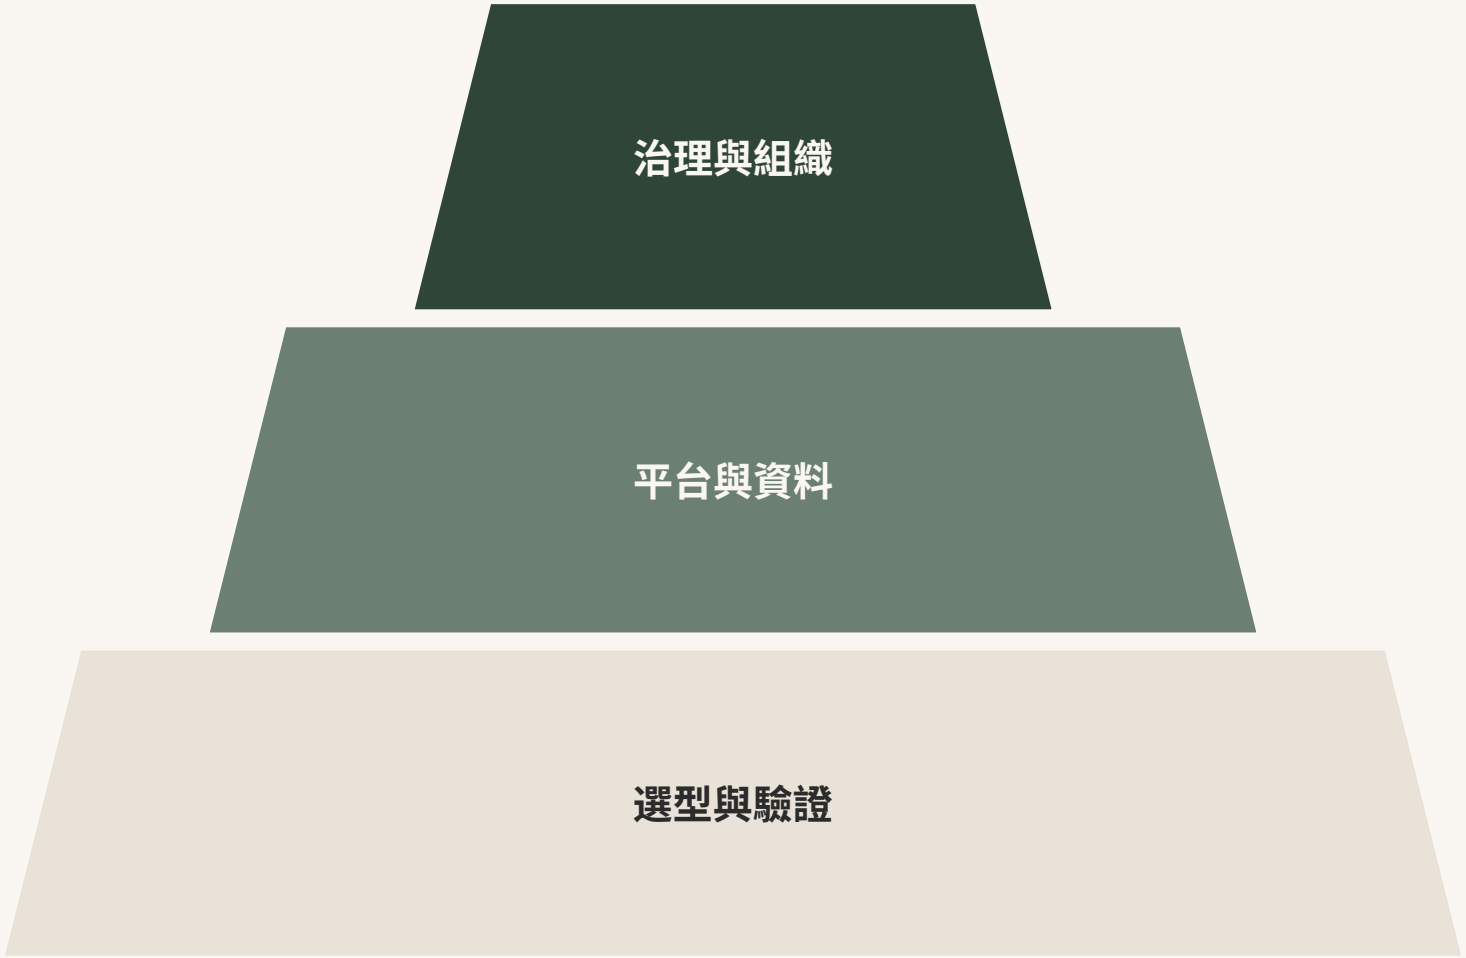

範圍與窗口、 RACI 、 KPI 定義、每週 Review

API Platform 、 Data Lake 、擷取與同步規則

三方案比較、 PoC 驗證、建置與交接

決策閘門的節奏

D01	D02	D03	D04	D05	D06
確認第一階段範圍	指派各團隊窗口	首批串接標的與試點廠	核定 PoC 預算	決定建置與維運團隊	資料落地方式

十二週課程與蜂巢里程碑對照

01



第 1–3 堂

D02 窗口指派、現況清冊

02



第 4–6 堂

D01 範圍、 D03 首批標的

03



第 7–9 堂

D04 選型、 CQS 燈塔

04



第 10–12 堂

D05 承接、維運交接

段落小結：蜂巢計畫第一階段



先打通底座

第一階段只做 API Platform 、 Data Lake 與首批串接。

本段走過的主題

- 蜂巢計畫要解決什麼
- 六階段推進
- 第一階段九項任務
- 六個待裁示的決策閘門
- 第二階段應用（進入條件後才建置）

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練：我的系統、我的角色

PART 03

演練：我的系統、我的角色

每位主管與 keyman，都要在蜂巢計畫裡找到自己的位置。



演練導覽：演練：我的系統、我的角色

01



演練一：畫出我負責的系統

02



演練二：對照九項任務與窗口

03



這門課的上課方式

演練一：畫出我負責的系統

演練

12 分

依團隊分組（ITS、IS、ERP、各廠 IT）

產出

一張團隊系統地圖：系統、支撐的流程階段、上下游介面

1. 列出團隊負責的系統與資料庫
2. 標示每個系統支撐成衣流程的哪個階段
3. 畫出與其他系統的資料往來
4. 圈出「只有一個人會修」的系統

畫出我負責的系統：進行方式

步驟 1



列出團隊負責的系統與資料庫

步驟 2



標示每個系統支撐成衣流程的哪個階段

步驟 3



畫出與其他系統的資料往來

步驟 4



圈出「只有一個人會修」的系統

產出：一張團隊系統地圖：系統、支撐的流程階段、上下游介面

演練二：對照九項任務與窗口

演練

12 分

同組延續

產出

團隊在九項任務中的角色（R／A／C／I）與建議窗口

1. 逐項讀九項任務
2. 標出團隊會擔任執行、負責、諮詢或知會
3. 推薦一位蜂巢計畫專責窗口
4. 寫下窗口每週可投入的時數

對照九項任務與窗口：進行方式

步驟 1

逐項讀九項任務

步驟 2

標出團隊會擔任執行、負責、諮詢或知會

步驟 3

推薦一位蜂巢計畫專責窗口

步驟 4

寫下窗口每週可投入的時數

產出：團隊在九項任務中的角色（R／A／C／I）與建議窗口

分組分享

Q1 你們團隊最擔心蜂巢計畫的哪一個環節?

Q2 哪一個系統的資料，最常被別的團隊要卻拿不到?

Q3 如果只能先打通一條資料管道，你們會選哪一條?

這門課的上課方式

1 先主管，再 keyman

主管先理解所有角色，再帶 keyman 進來。


2 邊做邊教

安裝時同步教操作與排錯，不做完才交接。

3 親自做、有人檢核

同仁親自執行，寧可多花時間；周副總協助檢核。

我的系統放在哪一層

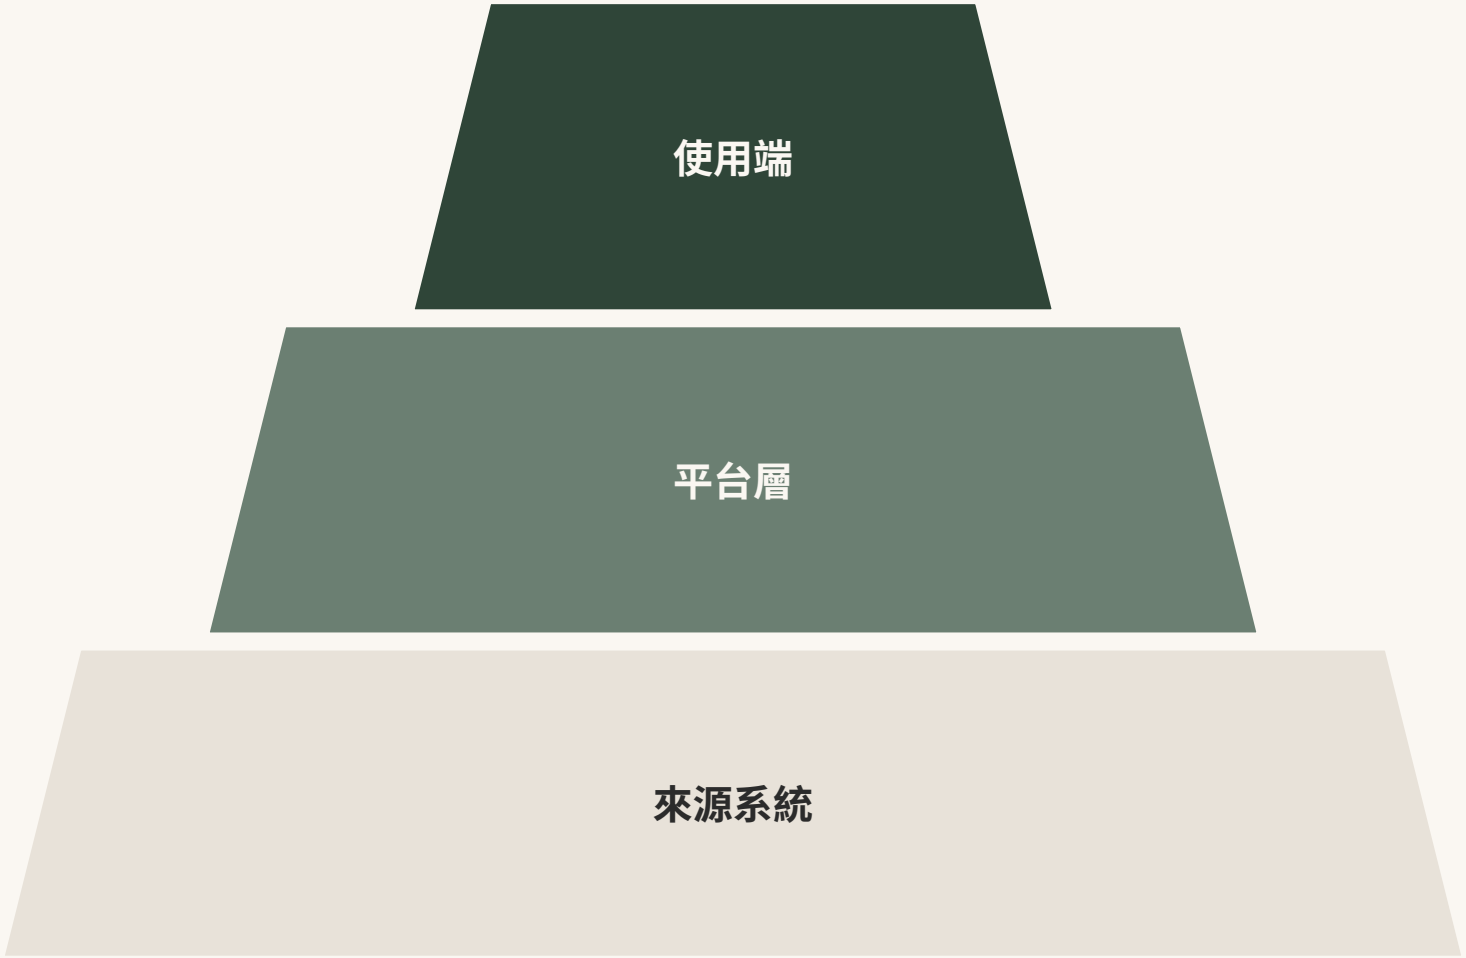

BI 報表、 KPI 看板、各廠應用

API Platform 、 Data Lake

D365 ERP 、 MES 、 CQS 、 IE 、 WMS 等

段落小結：演練：我的系統、我的角色

人人有位置

每個團隊都在九項任務中有明確的 R、A、C、I。

本段走過的主題

- 演練一：畫出我負責的系統
- 演練二：對照九項任務與窗口
- 這門課的上課方式

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
蜂巢計畫	RSI 內部 IT 數位底座計畫（Project Hive），先打通 API 與資料
Global Control Center	總部集中決策、各地回饋；報表可不同，管理邏輯須一致
決策閘門	D01 ～ D06，需由計劃主持人裁示後才能往下推進
PoC	以小範圍實測驗證方案可行，再決定正式建置
RACI	負責執行、最終負責、諮詢、知會四種角色

常見迷思與實際

迷思

- 數位轉型就是買新系統
- 先做 AI 才看得到成果
- IT 自己規劃就好

實際

- 先打通資料，系統才有用
- AI 建立在資料底座之上
- 業務、 IT 、各廠一起定義

課後自我檢核

- ☐ 我說得出蜂巢計畫要解決的三個問題
- ☐ 我知道自己團隊在九項任務中的角色
- ☐ 我畫出了團隊系統地圖
- ☐ 我理解六個決策閘門的用意

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

蜂巢計畫

RSI 內部 IT 數位底座計畫（Project Hive），先打通 API 與資料

Global Control Center

總部集中決策、各地回饋；報表可不同，管理邏輯須一致

決策閘門

D01～D06，需由計劃主持人裁示後才能往下推進

PoC

以小範圍實測驗證方案可行，再決定正式建置

RACI

負責執行、最終負責、諮詢、知會四種角色

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 管理邏輯一致

報表可以不同，背後的管理邏輯必須一致。

2 先打通底座

第一階段只做 API Platform 、Data Lake 與首批串接。

3 人人有位置

每個團隊都在九項任務中有明確的 R 、 A 、 C 、 I 。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成團隊系統地圖，並標出單點風險系統
- 各團隊提出一位蜂巢計畫專責窗口與每週投入時數
- 主管預讀蜂巢計畫實施藍圖 v2.2

下堂預告

第 2 堂：現況盤點與技術職能盤點

系統、資料庫、 API 與窗口清冊，以及主管先試填的技術職能問卷。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 管理邏輯一致：報表可以不同，背後的管理邏輯必須一致。
- 先打通底座：第一階段只做 API Platform 、 Data Lake 與首批串接。
- 人人有位置：每個團隊都在九項任務中有明確的 R 、 A 、 C 、 I 。

需要主管支持

- 完成團隊系統地圖，並標出單點風險系統
- 各團隊提出一位蜂巢計畫專責窗口與每週投入時數
- 主管預讀蜂巢計畫實施藍圖 v2.2

從這一堂到下一堂

第 1 堂（本堂）

蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

產出：管理邏輯一致、先打通底座、人人有位置

第 2 堂（下一堂）

現況盤點與技術職能盤點

先看清楚我們有什麼、誰會什麼，才知道從哪裡開始

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

8%

已完成 1 / 12 堂 ｜ 2026/11/02 （一）至 2027/01/29 （五） ｜ 12 週／17 服務日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

報表可以不一樣，
管理邏輯必須一致。

Howard Liao Ph.D. ｜ 第 1 堂　蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽
