RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 12 堂

試點推廣、維運交接與成果發表

試點廠打樣、各廠承接、誰開發誰負責

RSI Reliable Source Industrial

模組四　AI 應用、資安與推廣交接 ｜ 2027/01/25（一） ｜ 120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

規劃試點推廣

理解試點廠的選擇慣例，以及從試點複製到其他產區的步驟。

2

完成維運交接

能準備維運手冊、分工責任表與 SLA 監控，讓系統可以被接手。

3

發表轉型成果

以團隊十二堂的產出，提出 90 天與 12 個月的行動計畫。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	桌上演練檢討
10–35 分	Part 1　試點與推廣	試點選擇、複製步驟
35–60 分	Part 2　維運交接與第二階段	手冊、責任表、 SLA 、進入條件
60–70 分	中場休息	
70–110 分	Part 3　成果發表	各團隊發表與回饋
110–120 分	結業	下一步

上堂回顧與本堂銜接

1 上堂重點



基本防線、 3-2-1 備份、離線自治、 P1 ～ P4 與桌上演練。

2 十二堂回顧



共識與盤點、流程與資料底座、選型與工程治理、 AI 、資安與交接。

3 今天的目標



把產出變成可以接手、可以推廣的行動計畫。

課前暖身：三個問題

Q1 十二堂下來，你團隊最重要的產出是什麼？

Q2 如果你明天休假，你的系統有人接得住嗎？

Q3 90 天後，你希望看到什麼改變？

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出

發表內容

團隊轉型成果與 90 天行動計畫

課後作業

提交團隊 90 天行動計畫

課後作業

完成負責系統的維運手冊初版

課後作業

指定團隊推動者，參加每月進度檢視

上堂作業檢視：第 11 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
完成團隊負責系統的基本防線檢核	☐ 完成　☐ 進行中	
針對一個關鍵系統完成還原測試並記錄時間	☐ 完成　☐ 進行中	
準備第 12 堂成果發表：團隊十二堂的產出彙整	☐ 完成　☐ 進行中	

本堂學習路徑

規劃試點推廣

理解試點廠的選擇慣例，以及從試點複製到其他產區的步驟。


完成維運交接

能準備維運手冊、分工責任表與 SLA 監控，讓系統可以被接手。

發表轉型成果

以團隊十二堂的產出，提出 90 天與 12 個月的行動計畫。

120 分鐘怎麼用

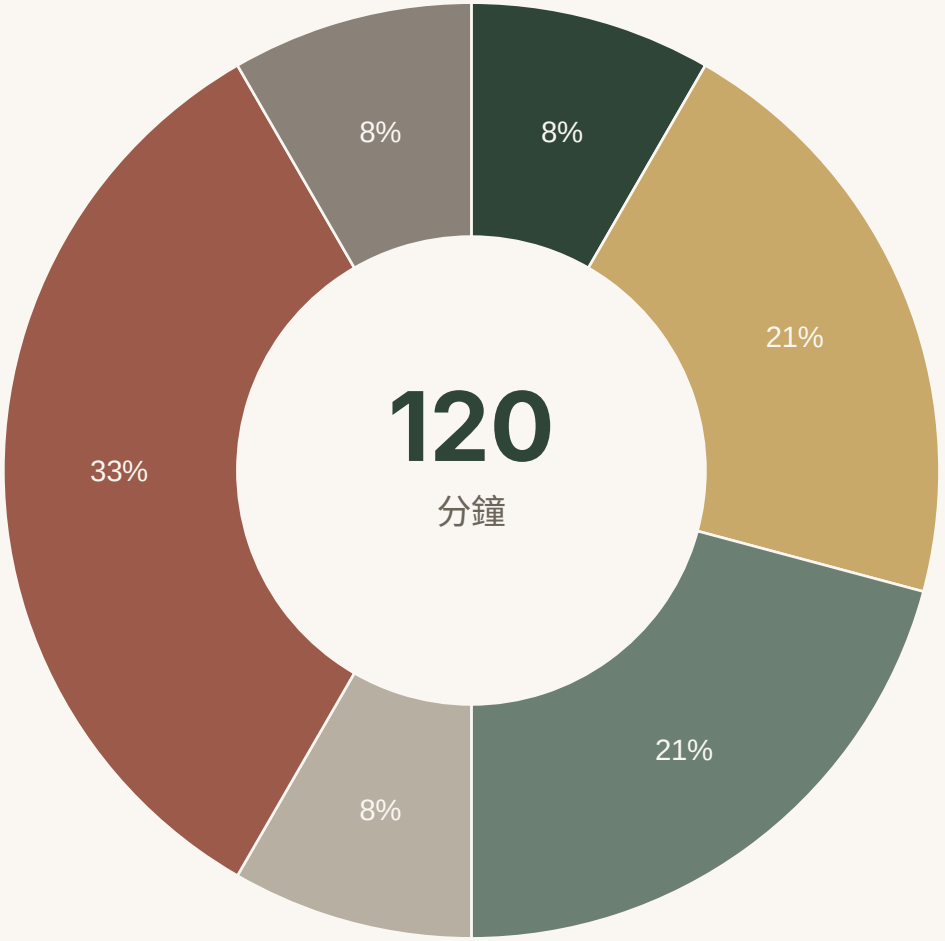

回顧與開場	10 分
試點與推廣	25 分
維運交接與第二階段	25 分
中場休息	10 分
成果發表	40 分
結業	10 分

PART 01

試點與推廣

先在一間工廠驗證，再推到其他產區。



本段導覽：試點與推廣

01



試點廠的選擇慣例

02



從試點到複製

03



誰開發，誰負責

04



推廣時的排程考量

試點廠的選擇慣例

柬埔寨廠

- 自動化與較新的項目
- 新平台導入
- 蜂巢計畫首批建議試點廠（待 D03 裁示）

越南廠

- 管理面的項目
- 流程與制度調整
- 管理機制的試行

從試點到複製

1

試點打樣

工廠實務協助修正

2

驗證通過

依驗收標準確認

3

總部訓練

回總部或線上受訓

4

各廠承接

由各廠 IT 主管推動

IE 與品管系統由總部親自到現場，帶著當地 IT 主管一起導入

誰開發，誰負責

誰開發，誰負責。

周副總維護責任原則， 10/16 會議。以 AI 輔助開發後，跨廠需求整合反而變得單純

推廣時的排程考量

- 避開旺季與出貨高峰
- 避開各國重要節慶與長假
- 各廠窗口人力與每週投入時數先確認
- 每一廠上線後保留穩定觀察期

原則

推廣是排程問題，也是人力問題；先確認窗口，再排時程。

試點到全面推廣

試點	修正	驗收	訓練	複製
一間工廠打樣	依現場回饋調整	依標準確認	各廠 IT 主管受訓	推廣到其他產區

推廣前的準備清單

窗口

各廠專責窗口與投入時數

排程

避開旺季與節慶

訓練

總部或線上訓練

文件

操作手冊與常見問題

回饋

問題回報與改善管道

觀察期

上線後穩定觀察

段落小結：試點與推廣

試點先行

柬埔寨試新平台，越南試管理，驗證後由各廠承接。

本段走過的主題

- 試點廠的選擇慣例
- 從試點到複製
- 誰開發，誰負責
- 推廣時的排程考量

PART 02

維運交接與第二階段

能被別人接手，才算真正完成。



本段導覽：維運交接與第二階段

01

階段 6：維運交接

02



維運手冊的最低內容

03

第二階段應用

04



90 天與 12 個月

階段 6： 維運交接

1 維運手冊

架構、部署、監控、備份還原、常見問題處理。

2 分工責任表

每個系統、每支 API 、每條資料管道的主責與代理。

3 SLA 監控

依 P1 ～ P4 分級的回應時限與監控上線。

蜂巢藍圖：建置後 4 週完成維運交接，分工表生效、 SLA 監控上線

維運手冊的最低內容

章節	內容
系統概觀	架構圖、元件、相依系統
部署與設定	環境、部署步驟、設定項目
監控與告警	監控指標、告警門檻、通知對象
備份與還原	備份排程、還原步驟、上次測試日期
常見問題	症狀、判斷方式、處理步驟、升級對象

第二階段應用

項目	內容
BI 優化	盤點既有報表與使用問題
KPI 系統化	統一指標定義、口徑、資料來源與負責人
品質驗證	確認資料品質，驗證產品品質差異
Agentic AI ／ RAG	使用情境、知識來源、資料權限
Global Control Center	總部集中決策，各產區回饋校正

90 天與 12 個月

90 天

- GitLab 收斂與 MR 門禁全面上線
- API 清冊與 Swagger 補齊
- CQS 燈塔兩個 Sprint 試行完成
- 基本防線檢核全數完成

12 個月

- API Platform 與 Data Lake 正式上線
- 試點廠驗證並開始複製
- 維運交接完成，SLA 監控運作
- 第二階段應用依進入條件啟動

維運交接的三件套


維運手冊
架構、部署、監控、還原
交接演練
由接手者實際操作一次
可以
被接手
分工責任表
主責與代理
SLA 監控
P1 ～ P4 回應時限

第二階段五項應用

01

BI 優化

既有報表改善

02

KPI 系統化

統一指標

03

品質驗證

資料品質與品質差異

04

Agentic AI

RAG 應用場景

05

GCC

總部治理模式

進入條件： PoC 驗收通過，且首批工廠資料連續 30 天每日結算無差異

段落小結：維運交接與第二階段

可以接手

維運手冊、分工責任表、 SLA 監控。

本段走過的主題

- 階段 6： 維運交接
- 維運手冊的最低內容
- 第二階段應用
- 90 天與 12 個月

中場休息　10 分鐘

休息回來：成果發表

PART 03

成果發表

每個團隊十分鐘，用自己的產出說話。



演練導覽：成果發表

01

發表內容

02

評估構面

03

結業之後

發表內容

演練

40 分

各團隊發表 8 分鐘、回饋 2 分鐘

產出

團隊轉型成果與 90 天行動計畫

1. 團隊十二堂的關鍵產出
2. 目前完成到哪裡、卡在哪裡
3. 90 天內要完成的三件事
4. 需要周副總或其他團隊協助的事項

發表內容：進行方式

步驟 1

團隊十二堂的關鍵產出

步驟 2

目前完成到哪裡、卡在哪裡

步驟 3

90 天內要完成的三件事

步驟 4

需要周副總或其他團隊協助的事項

產出：團隊轉型成果與 90 天行動計畫

評估構面

構面	看什麼
連結 KPI	產出能否對應到業務 KPI
可驗收	有明確的完成標準與證據
可接手	文件、主責與代理清楚
治理到位	版控、審核、資安與 AI 邊界有落實
可推廣	能在其他廠或其他系統複製

結業之後

- 每月一次進度檢視，追蹤 90 天行動計畫
- 各團隊指定一位推動者，作為後續窗口
- 新同仁以本課程產出作為入門教材
- 十二堂產出彙整為 RSI 內部 IT 知識庫

持續

課程結束，是轉型工作的開始。

成果發表的流程

8 分

團隊發表

2 分

回饋與提問


評估

依五個構面評估

彙整

形成 90 天行動計畫

結業後的持續機制

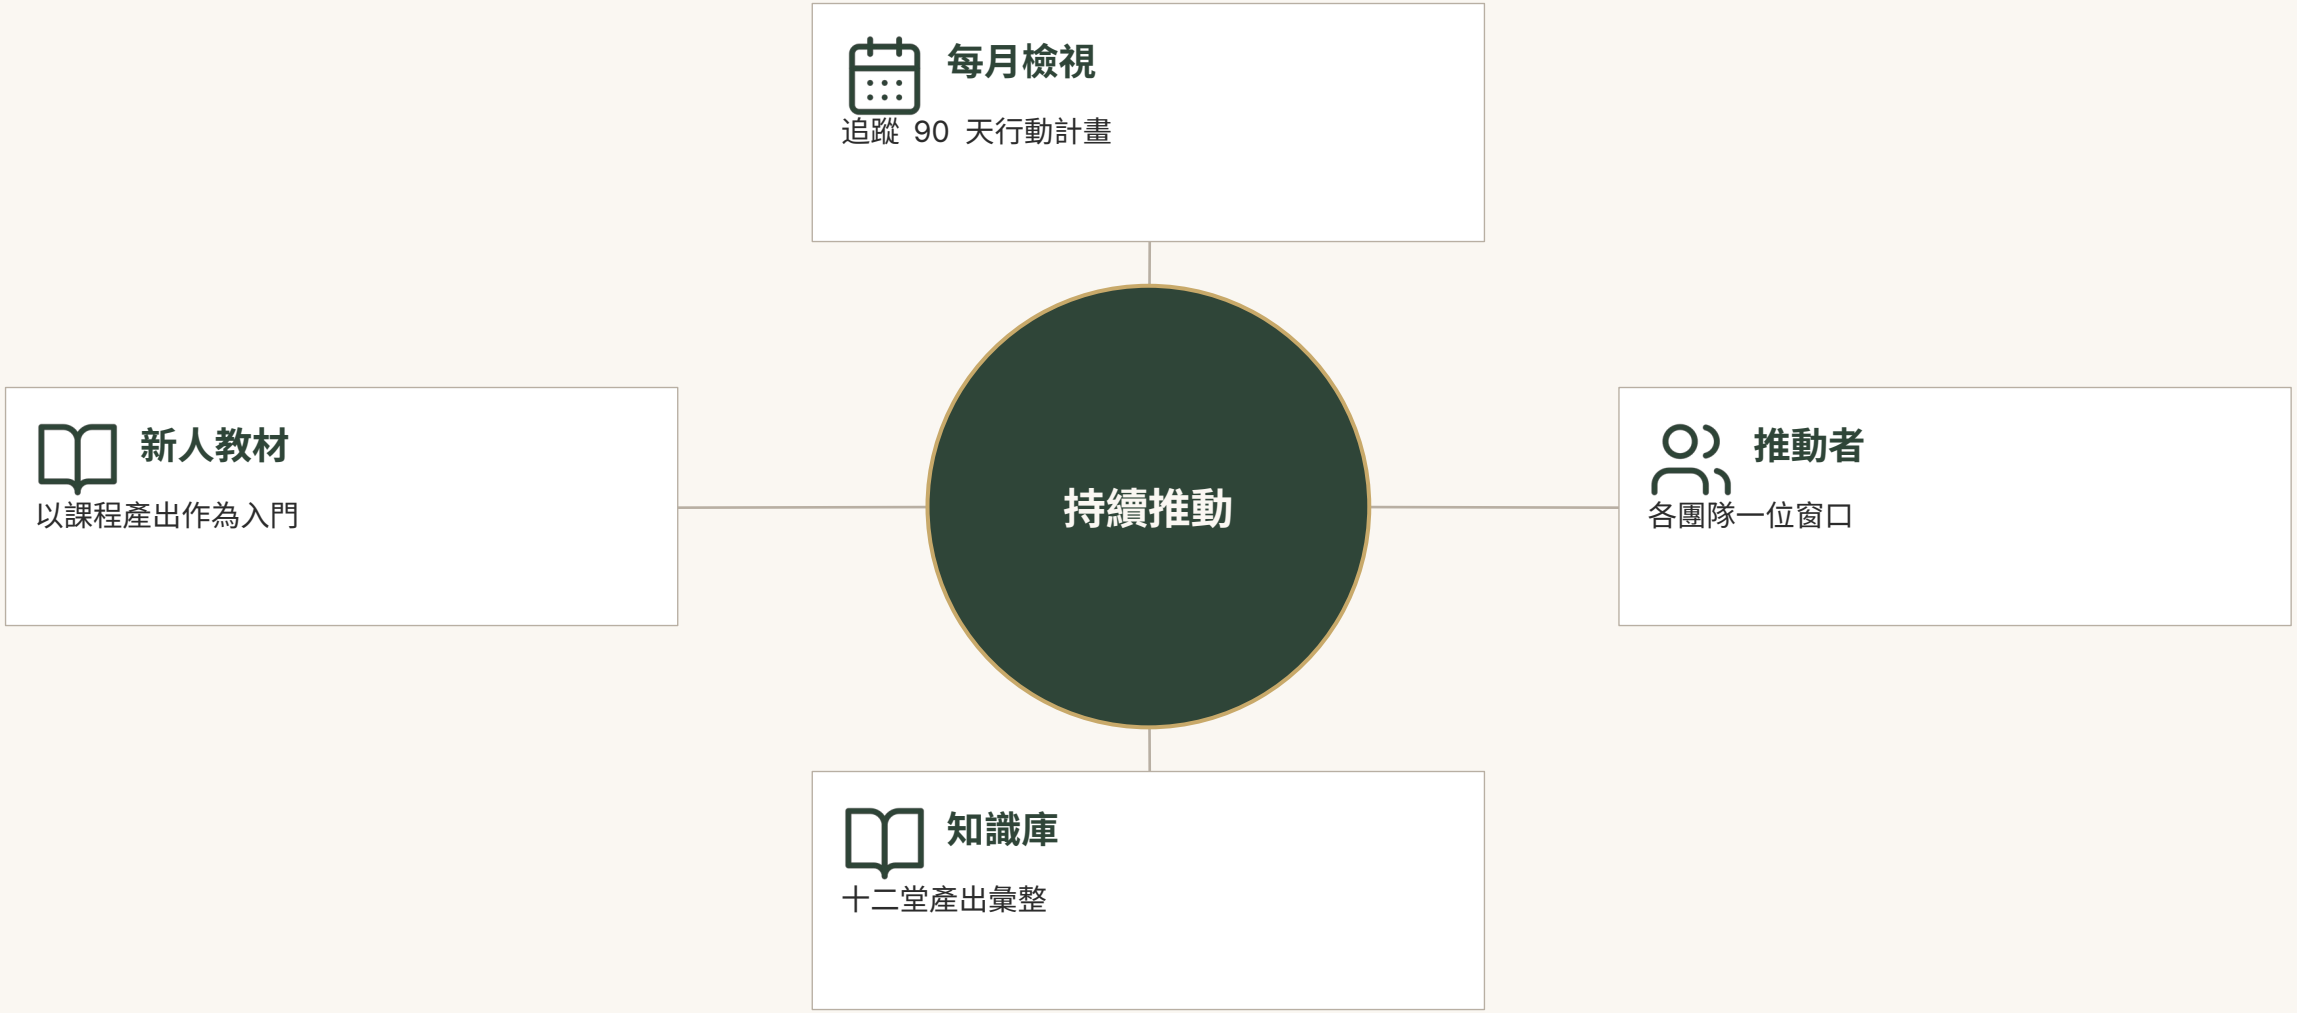
每月檢視
追蹤 90 天行動計畫
新人教材
以課程產出作為入門
持續推動
推動者
各團隊一位窗口
知識庫
十二堂產出彙整

段落小結：成果發表

持續推進

90 天與 12 個月計畫，每月檢視。

本段走過的主題

- 發表內容
- 評估構面
- 結業之後

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
試點廠	新系統先在一間工廠驗證後再推廣
維運手冊	架構、部署、監控、備份還原與常見問題
分工責任表	每個系統、 API 、資料管道的主責與代理
SLA	依事件等級約定的服務回應時限
進入條件	第二階段啟動前必須達成的驗收門檻

常見迷思與實際

迷思

- 上線就是結束
- 試點成功就能直接複製
- 課程結束就結束了

實際

- 能被接手才算完成
- 各廠承接需要訓練與窗口
- 結業是轉型工作的開始

課後自我檢核

- ☐ 我完成了維運手冊初版
- ☐ 我的團隊有 90 天行動計畫
- ☐ 我知道第二階段的進入條件
- ☐ 我的團隊指定了推動者

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

試點廠

新系統先在一間工廠驗證後再推廣

維運手冊

架構、部署、監控、備份還原與常見問題

分工責任表

每個系統、 API 、資料管道的主責與代理

SLA

依事件等級約定的服務回應時限

進入條件

第二階段啟動前必須達成的驗收門檻

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 試點先行

柬埔寨試新平台，越南試管理，驗證後由各廠承接。

2 可以接手

維運手冊、分工責任表、 SLA 監控。

3 持續推進

90 天與 12 個月計畫，每月檢視。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 提交團隊 90 天行動計畫
- 完成負責系統的維運手冊初版
- 指定團隊推動者，參加每月進度檢視

下堂預告

課程結業

每月進度檢視持續進行；第二階段依進入條件啟動。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 試點先行：柬埔寨試新平台，越南試管理，驗證後由各廠承接。
- 可以接手：維運手冊、分工責任表、 SLA 監控。
- 持續推進： 90 天與 12 個月計畫，每月檢視。

需要主管支持

- 提交團隊 90 天行動計畫
- 完成負責系統的維運手冊初版
- 指定團隊推動者，參加每月進度檢視

從這一堂到下一堂

第 12 堂（本堂）

試點推廣、維運交接與成果發表

產出：試點先行、可以接手、持續推進

結業之後

每月進度檢視與第二階段


持續推動 90 天行動計畫

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

100%

已完成 12 / 12 堂 ｜ 2026/11/02（一）至 2027/01/29（五）｜ 12 週／17 服務日



模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

先打通資料，
再談智慧。

Howard Liao Ph.D. | 第 12 堂　試點推廣、維運交接與成果發表
